

19.11.2021


Vesikattotyön työvaihetarkastus

Osoite Vanha Jäähalli kermikatot Saneeraus v.2021

Katselmuspöytäkirja

Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:29

Jäähalli alipainetuuletin korjaus ja Uimahallin vesikattotyön työvaihetarkastus ja raportointi !

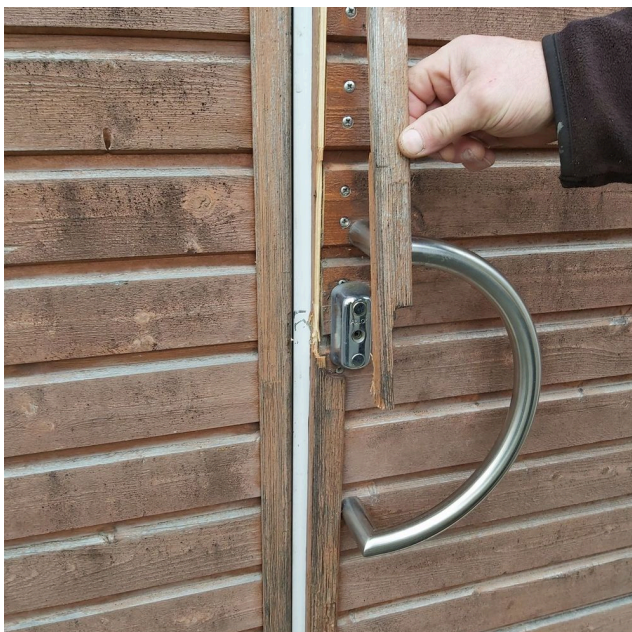

Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:35

Uimahalliin yritetty yöllä murtautua ,jäljet näkyvät tässä !



Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:35

Pintakermit valmiina kiinnitettäväksi ! Kerabit tuotteita !



Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:35
Alustasta poistettu vanha singeli ja pohja pesty painepesuri



Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:35
Pohjakermi tulee kiinnitetyksi kuumabitumilla



Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:35
Katolle nousu tapahtuu nostokorinostimesta



Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:35
Työalue on putoamissuojattu vastapainokaiteilla !

Havainto

Ahti Laaksonen 21.11.2021 18:49

Työmaa käynnin havaintoina seuraavaa: Työturvallisuus on urakoitsijalla otettu hyvin huomioon ,vesikatto-osuus ,jossa työtä suoritetaan on putoamissuojattu kaikilta reuna-alueita virallisilla vastapainokaiteilla. Katolle nousuun tapahtuu henkilönostimella rakennuksen päädystä. Työt on aloitettu 11.11 vanhan kattosingelin =(suojakivi)poistolla , tämän jälkeen kattoalue puhdistettiin painepesemällä . Tarkastushetkellä asentajat tekivät alustan kuivausta kosteudesta ja aloittelivat kumibitumi pohjakermiin (kerabit 3000 U) asennusta ,joka suoritetaan kuumabitumilla liimaten kauttaaltaan alustaan kiinni. Sääolojen salliessa työ saadaan tehtyä alkuviikon 23 - 24.11 mennessä ? (Kuitenkin säävarauksella !) Pintakermiksi tulee pintasiroteellinen tummanharmaa hitsattava kumibitumikermi (Kerabit 5100 T) ! Mielestäni työt ja työjärjestys sekä työturvallisuus ovat hyvässä

kunnossa.

Yhteenveto

Havainnon suorittaja T:mi Vesikatto Dr/Ahti Laaksonen

Havaintotapahtumassa mukana olijat:

Ahti Laaksonen 10.05.2022 13:56

Urakoitsija
